



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2024 del mes julio.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance del 35% en julio de 2024.

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño de planos y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas. En trámite de Adenda.

 730-5300 ext. 1402

 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

PROYECTO MEJORA DE CUBIERTA PARA EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA SEDE DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Arteliz Construcciones, S.A., por un valor de B/.232,020.59, tiene un avance de 40% en julio 2024.

Orden de proceder: 26 de diciembre 2023 al 24 de marzo 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. Proyecto presenta atraso en la fabricación de las láminas de techo tipo termopanel.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 75%.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

TERCERA FASE DEL AUDITORIO DE CRUBA DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Distribuidora y Constructora Eneida, S.A., por un valor de B/.152,675.25, con un avance de 5% en julio 2024.

Orden de proceder: 15 de abril al 12 de agosto 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 55%.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

PROYECTO REMODELACIÓN DE LOS 4 MÓDULOS DE BAÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CAMPUS CENTRAL.

Licitado y adjudicado a la empresa Grupo Jaramillo, S.A., por un valor de B/.65,675.44, con un avance de 10% en julio 2024.

Orden de proceder: 13 de mayo al 01 de julio 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. Se cobró multa al contratista. Actualmente se encuentra en trámite de pago al contratista.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

TERCERA FASE DEL EDIFICIO DE 6 AULAS DE MEDICINA DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Grupo Jaramillo, S.A., por un valor de B/.32,720.00, con un avance de 10% en julio 2024.

Orden de proceder: 31 de mayo al 04 de julio 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. Se cobró multa al contratista. Actualmente se encuentra en trámite de pago al contratista.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PARA ESTACIONAMIENTOS NUEVOS DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Luis Alfredo Espinoza Palma, S.A., por un valor de B/.19,992.00, con un avance de 10% en julio 2024.

Orden de proceder: 10 de junio al 25 de julio 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. Actualmente se encuentra en trámite de pago al contratista.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Geisa Internacional, S.A., por un valor de B/.49,859.74, con un avance de 70% en julio 2024.

Orden de proceder: 24 de junio al 02 de agosto 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. Actualmente se encuentra en trámite de pago al contratista.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022




UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE PARA EL AUDITORIO DEL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa C & E Ingeniería, S.A., por un valor de B/.22,150.00, con un avance de 100% en julio 2024. Orden de proceder: 28 de junio al 17 de Julio 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. Actualmente se encuentra en trámite de pago al contratista.

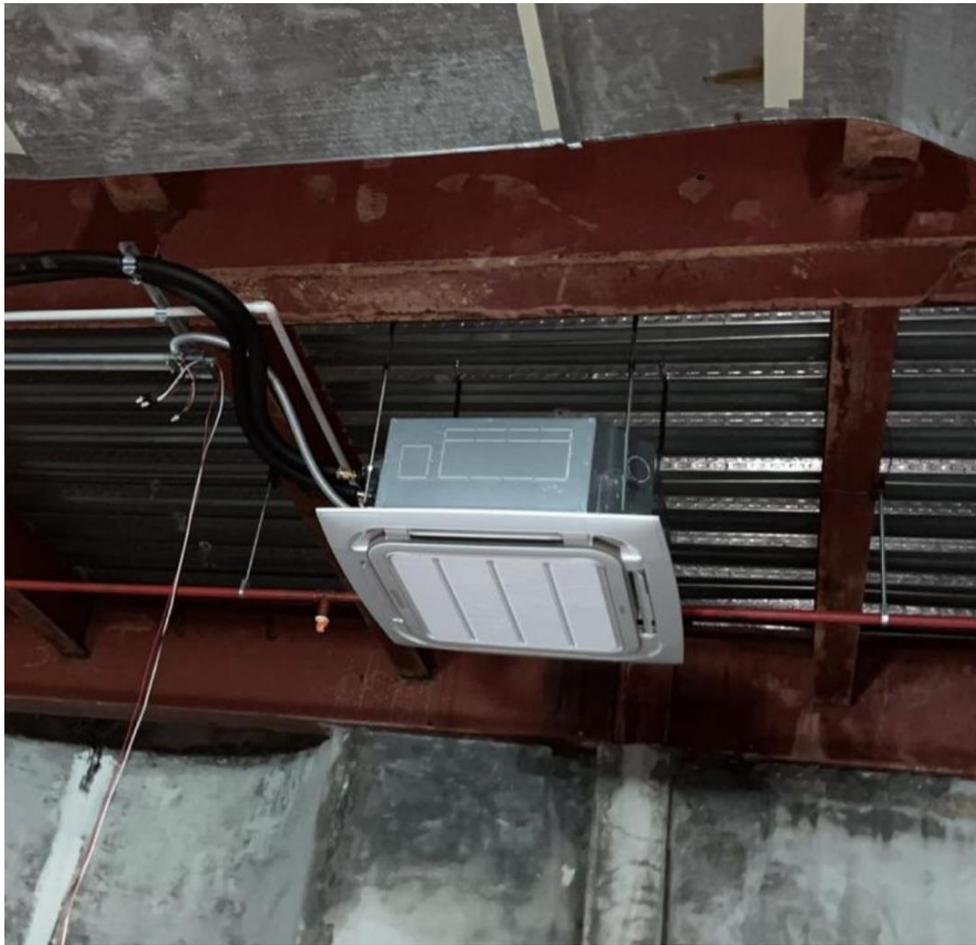

☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

GALERA PARA CONTENEDORES DE BASURA DEL SACH DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Inversiones Meygui, S.A., por un valor de B/.28,000.04, con un avance de 10% en julio 2024.

Orden de proceder: 10 de julio al 17 de septiembre 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 10%.



Realizado por: Ing. Carlos Santamaría

730-5300 ext. 1402

 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022
